

碧侯教會 室內裝修工程

工程規劃報告 Construction Planning Report

專案規模	3 層樓 + 頂樓加蓋，約 549 坪
總金額	NT\$ 16,729,761（工程款 14,484,642 + 監管費 10% + 營業稅）
報價日 / 設計簡報	2026/05/23 / 2026/01/26
進場保護日（開工）	2026/06/19（業主指定）
預估交屋	2026/12/02（總工期約 22~24 週）
報告產出日	2026/06/15

關鍵提醒

- 合約未含/待評估 4 工項（泥作防水、地坪、空調、油漆）皆在關鍵路徑或隱蔽界面，開工前務必界定。
- 長交期項目（石材、系統櫃、廠製門、頂樓鋼構、設備）應立即發包；偏遠工地運輸提前備料。
- 2F 主會堂（鷹架+80坪天花+花崗岩+木作）為資源最密集之關鍵空間，主導總工期。
- 天花封板前須完成消防/空調整合（不可逆隱蔽工程）。

※ 本報告為規劃建議版，實際依現場、備料、天候與業主決議滾動調整。


工項預算總覽（依報價單）

項次	工程項目	金額 (NT\$)	備註
1	保護工程 / 鷹架工程	1,015,700	
2	拆除工程	52,478	
3	水電工程	990,300	暫估、待確認施作項目
4	輕鋼架工程	1,793,700	
5	泥作工程	—	尚未評估
6	金屬工程	2,252,064	含頂樓加蓋鋼構、金屬床架
7	木作工程(廠製門)	1,848,590	
8	固定式衣櫃 / 系統櫃	1,921,396	含56組被褥櫃+床板
9	石材工程	1,843,884	雅典白花崗岩、小雕刻白
10	玻璃工程	57,491	
11	訂製家飾(窗簾、裱布)	377,280	
12	地坪工程	—	未含
13	環境維護工程	352,500	549坪粗清+細清
14	照明設備	433,384	
15	磁磚工程	135,660	不含磚、僅貼工
16	人造石工程	207,088	
17	銘版工程	41,120	
18	白板工程	150,360	
19	家具工程	—	含傳道房檯燈
20	設備工程	786,516	飲水機/冰箱/烘碗機/各式扇/防墜網/機櫃
21	消防工程	225,132	多為既有，延伸/下拉
22	空調工程	—	未含
23	油漆工程	—	未含
	合計	14,484,642	
	監管費（工程款 10%）	1,448,464	
	營業稅（5%）	796,655	
	總金額	16,729,761	

工程進度甘特圖（規劃建議版）

碧侯教會 室內裝修工程 — 工程進度甘特圖（規劃建議版）

總金額 NT\$16,729,761（含監管費 10% + 營業稅） | 3 層樓 + 頂樓加蓋 | 約 549 坪 | 進場保護日 2026/06/19

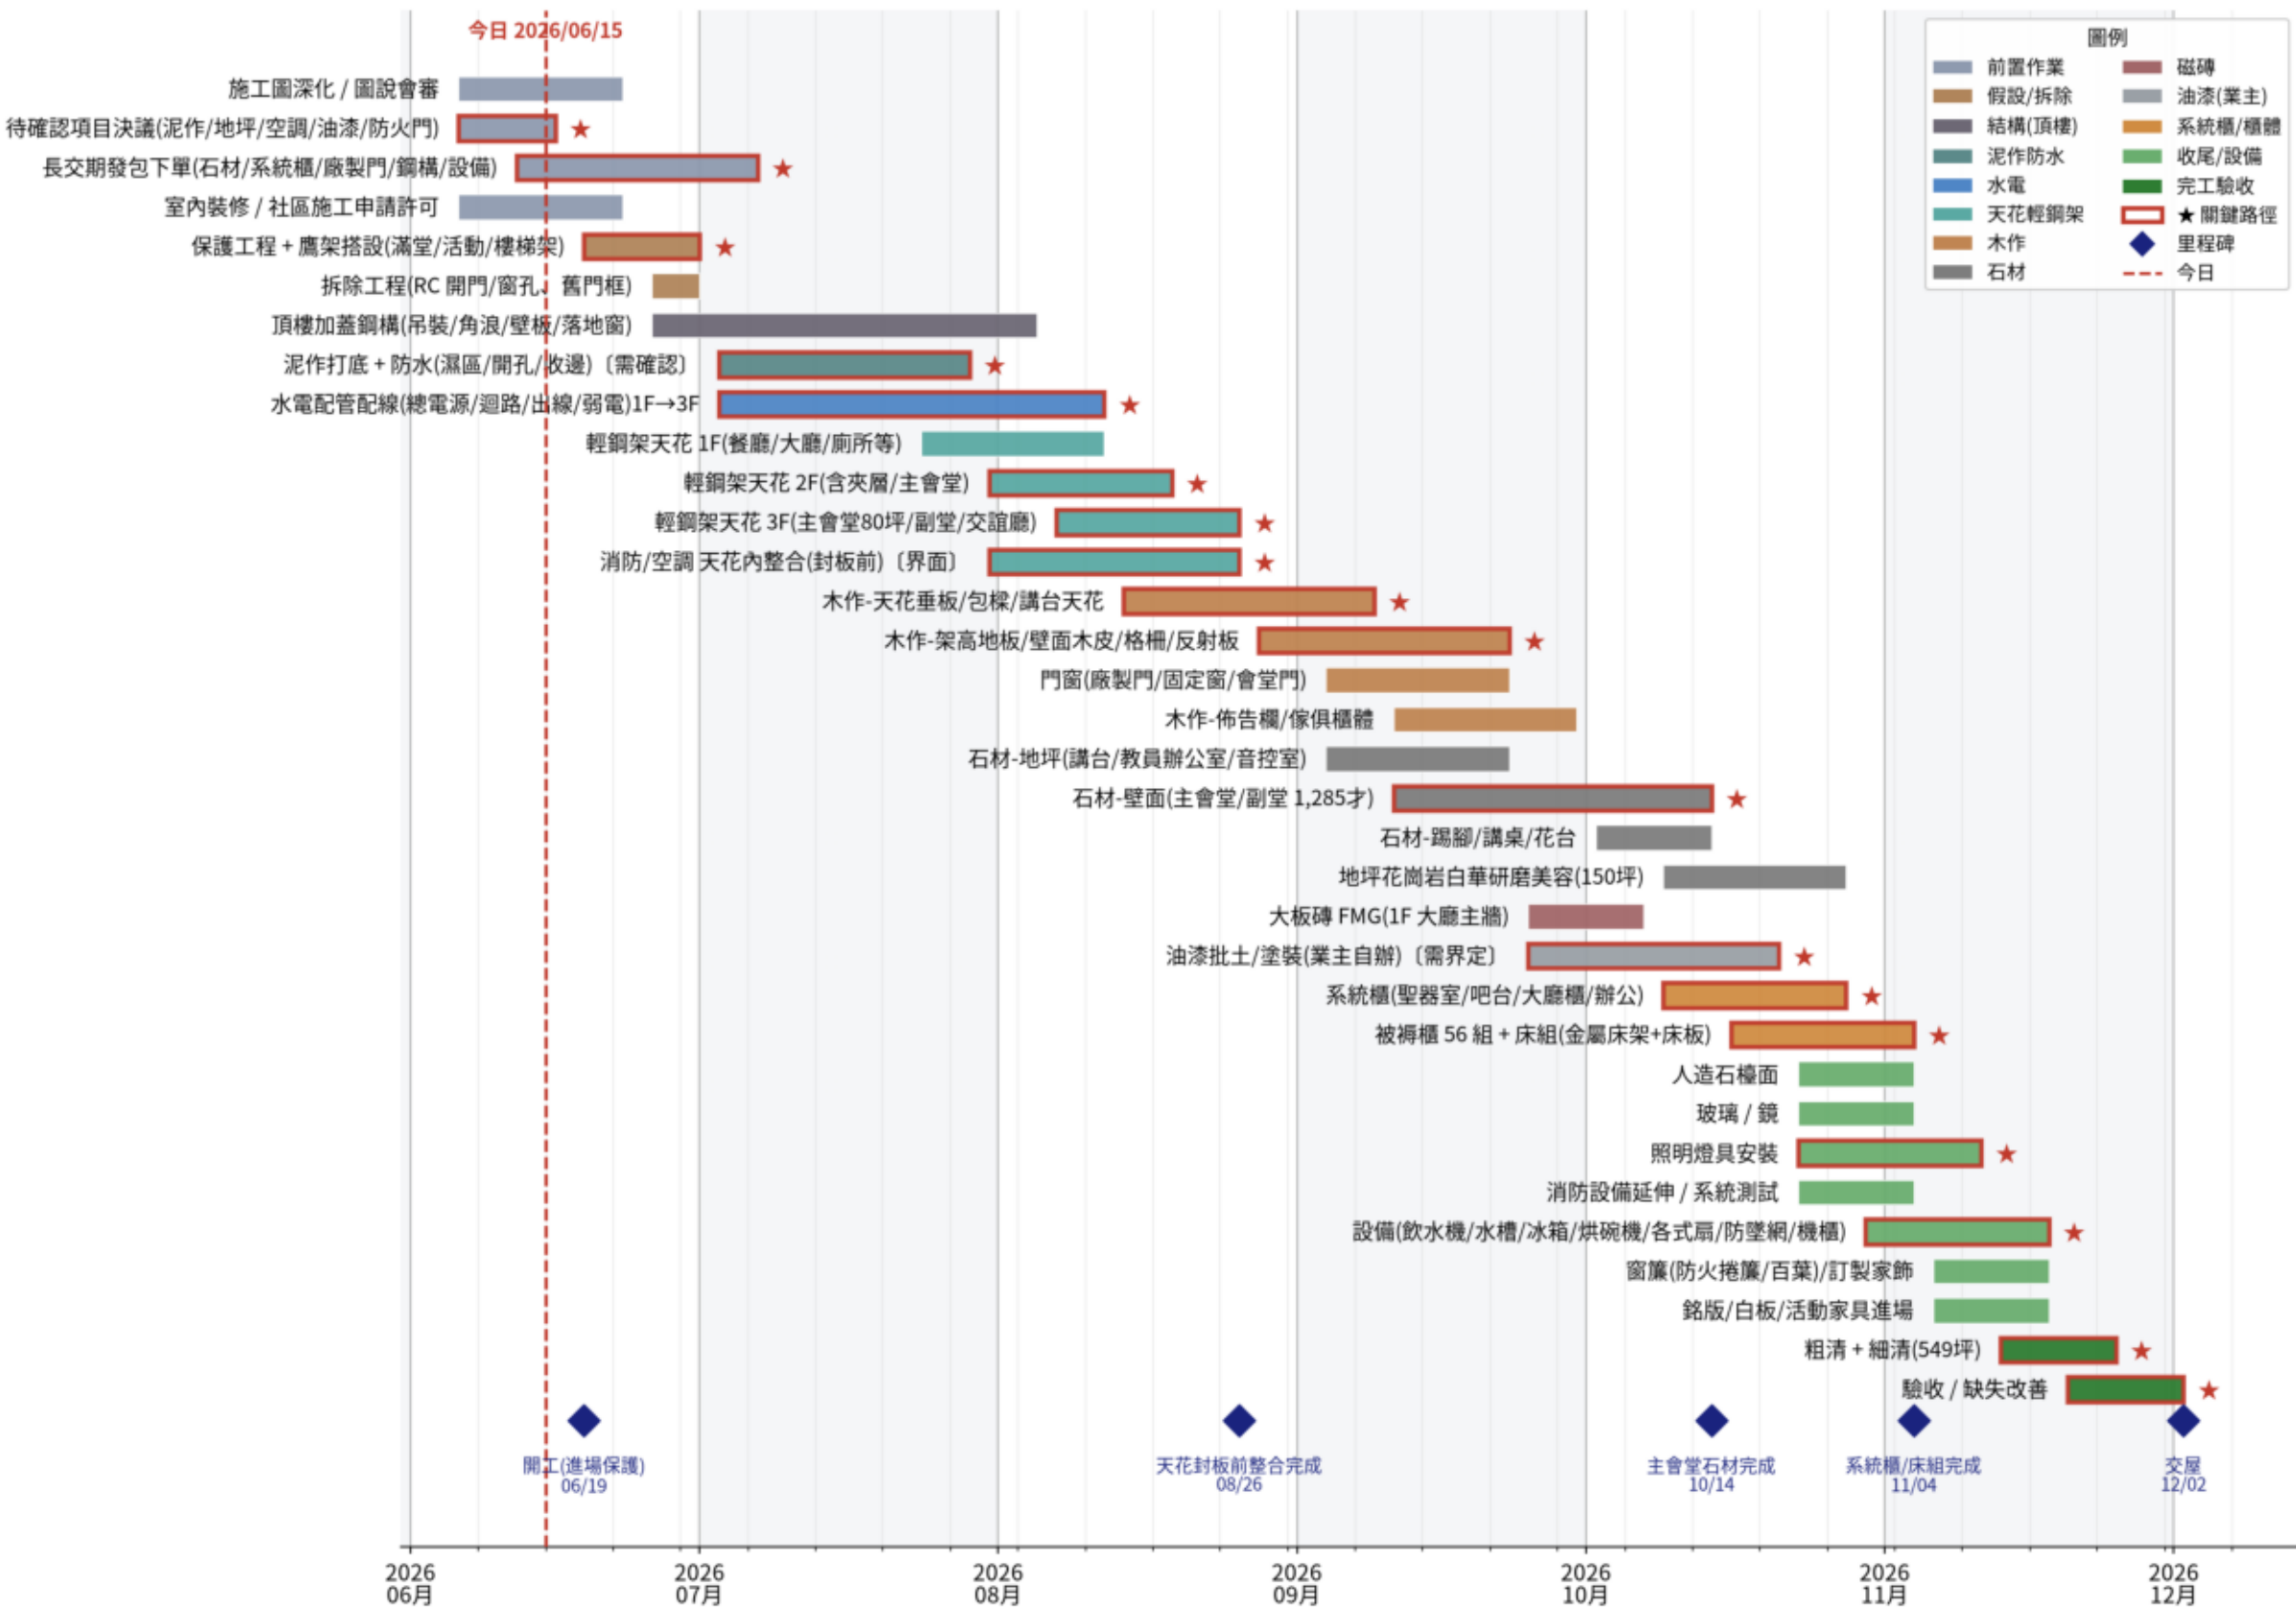

假設：進場保護 2026/06/19、週 6 工作天，預估 2026/12/02 交屋。（需確認/界定）之泥作防水、地坪、空調、油漆未含於本合約，須先確認施作介面與廠商，否則影響關鍵路徑。本圖為規劃版，依現場與備料進度滾動調整。

工程進度明細表

★＝關鍵路徑

#	階段	工項	起	迄	工天	關鍵	前置	備註
1	前置作業	施工圖深化 / 圖說會審	06/06	06/23	15		簽約	
2	前置作業	待確認項目決議(泥作/地坪/空調/油漆/防火門)	06/06	06/16	9	★	簽約	開工前須結案
3	前置作業	長交期發包下單(石材/系統櫃/廠製門/銅構/設備)	06/12	07/07	22	★	圖說確認	偏遠工地提前備料
4	前置作業	室內裝修 / 社區施工申請許可	06/06	06/23	15		簽約	
5	假設/拆除	保護工程 + 鷹架搭設(滿堂/活動/樓梯架)	06/19	07/01	11	★	進場	保護日 6/19 起
6	假設/拆除	拆除工程(RC 開門/窗孔、舊門框)	06/26	07/01	5		保護完成	
7	結構(頂樓)	頂樓加蓋鋼構(吊裝/角浪/壁板/落地窗)	06/26	08/05	35		拆除、吊裝排程	室外、可平行
8	泥作防水	泥作打底 + 防水(濕區/開孔/收邊)〔需確認〕	07/03	07/29	23	★	拆除完成	合約未含、須界定
9	水電	水電配管配線(總電源/迴路/出線/弱電)1F→3F	07/03	08/12	35	★	拆除、放樣	
10	天花輕鋼架	輕鋼架天花 1F(餐廳/大廳/廁所等)	07/24	08/12	17		水電上方完成	
11	天花輕鋼架	輕鋼架天花 2F(含夾層/主會堂)	07/31	08/19	17	★	水電上方完成	
12	天花輕鋼架	輕鋼架天花 3F(主會堂80坪/副堂/交誼廳)	08/07	08/26	17	★	水電、鷹架	
13	天花輕鋼架	消防/空調 天花內整合(封板前)〔界面〕	07/31	08/26	23	★	天花骨架	封板前不可逆
14	木作	木作-天花垂板/包樑/講台天花	08/14	09/09	23	★	天花完成	
15	木作	木作-架高地板/壁面木皮/格柵/反射板	08/28	09/23	23	★	泥作、天花	
16	木作	門窗(廠製門/固定窗/會堂門)	09/04	09/23	17		廠製門到貨	
17	木作	木作-佈告欄/傢俱櫃體	09/11	09/30	17		壁面完成	
18	石材	石材-地坪(講台/教員辦公室/音控室)	09/04	09/23	17		泥作粉光	
19	石材	石材-壁面(主會堂/副堂 1,285才)	09/11	10/14	29	★	泥作底、木作底	重工、量大
20	石材	石材-踢腳/講桌/花台	10/02	10/14	11		壁面石材	
21	石材	地坪花崗岩白華研磨美容(150坪)	10/09	10/28	17		石材鋪設	
22	磁磚	大板磚 FMG(1F 大廳主牆)	09/25	10/07	11		木作夾板底	
23	油漆(業主)	油漆批土/塗裝(業主自辦)〔需界定〕	09/25	10/21	23	★	木作完成	合約未含
24	系統櫃/櫃體	系統櫃(聖器室/吧台/大廳櫃/辦公)	10/09	10/28	17	★	油漆、地坪	
25	系統櫃/櫃體	被褥櫃 56 組 + 床組(金屬床架+床板)	10/16	11/04	17	★	寢室完成面	量大、分批進場
26	收尾/設備	人造石檯面	10/23	11/04	11		櫃體就位	
27	收尾/設備	玻璃 / 鏡	10/23	11/04	11		木作、櫃體	
28	收尾/設備	照明燈具安裝	10/23	11/11	17	★	天花、油漆	
29	收尾/設備	消防設備延伸 / 系統測試	10/23	11/04	11		天花完成	
30	收尾/設備	設備(飲水機/水槽/冰箱/烘碗機/各式扇/防壁網/機櫃)	10/30	11/18	17	★	水電、櫃體	
31	收尾/設備	窗簾(防火捲簾/百葉)/訂製家飾	11/06	11/18	11		窗洞、油漆	
32	收尾/設備	銘版/白板/活動家具進場	11/06	11/18	11		完成面	
33	完工驗收	粗清 + 細清(549坪)	11/13	11/25	11	★	各工項退場	
34	完工驗收	驗收 / 缺失改善	11/20	12/02	11	★	細清	

細部施工順序圖（依空間類型，涵蓋所有區域）

碧侯教會 室內裝修工程 — 細部施工順序圖（依空間類型，涵蓋所有區域）

讀法：每列為一種空間類型，①②③…為該空間之施工先後；「||」表可平行；〔整合〕為封板前不可逆隱蔽工程。全棟採『濕程/水電/天花 由下而上、完成面 由上而下退場』之流水原則。




工種圖例					
鷹架：假設/鷹架/防壁	水電：水電配管配線	木作：木作	油漆：油漆(業主自辦)	人造石：人造石檯面	設備：設備/機櫃
拆除：拆除/開孔	天花：輕鋼架/天花/隔間	石材：石材	系統櫃：系統櫃/櫃體/床板	玻璃：玻璃/鏡	家飾：家具/窗簾/白板/銘版
泥作：泥作/防水	整合：消防/空調 天花內整合(封板前)	磁磚：磁磚/FMG大板磚	金屬：金屬/鋼構/床架	燈具：照明燈具	清潔：清潔/驗收

分區進場時程圖（各區工序對應實際日期）

色塊＝該區當期工種；左側數字＝進場順位；右側為退場(清潔完)日。開工(進場保護) 2026/06/19

碧侯教會 室內裝修工程－分區進場時程圖（各區工序對應實際日期）

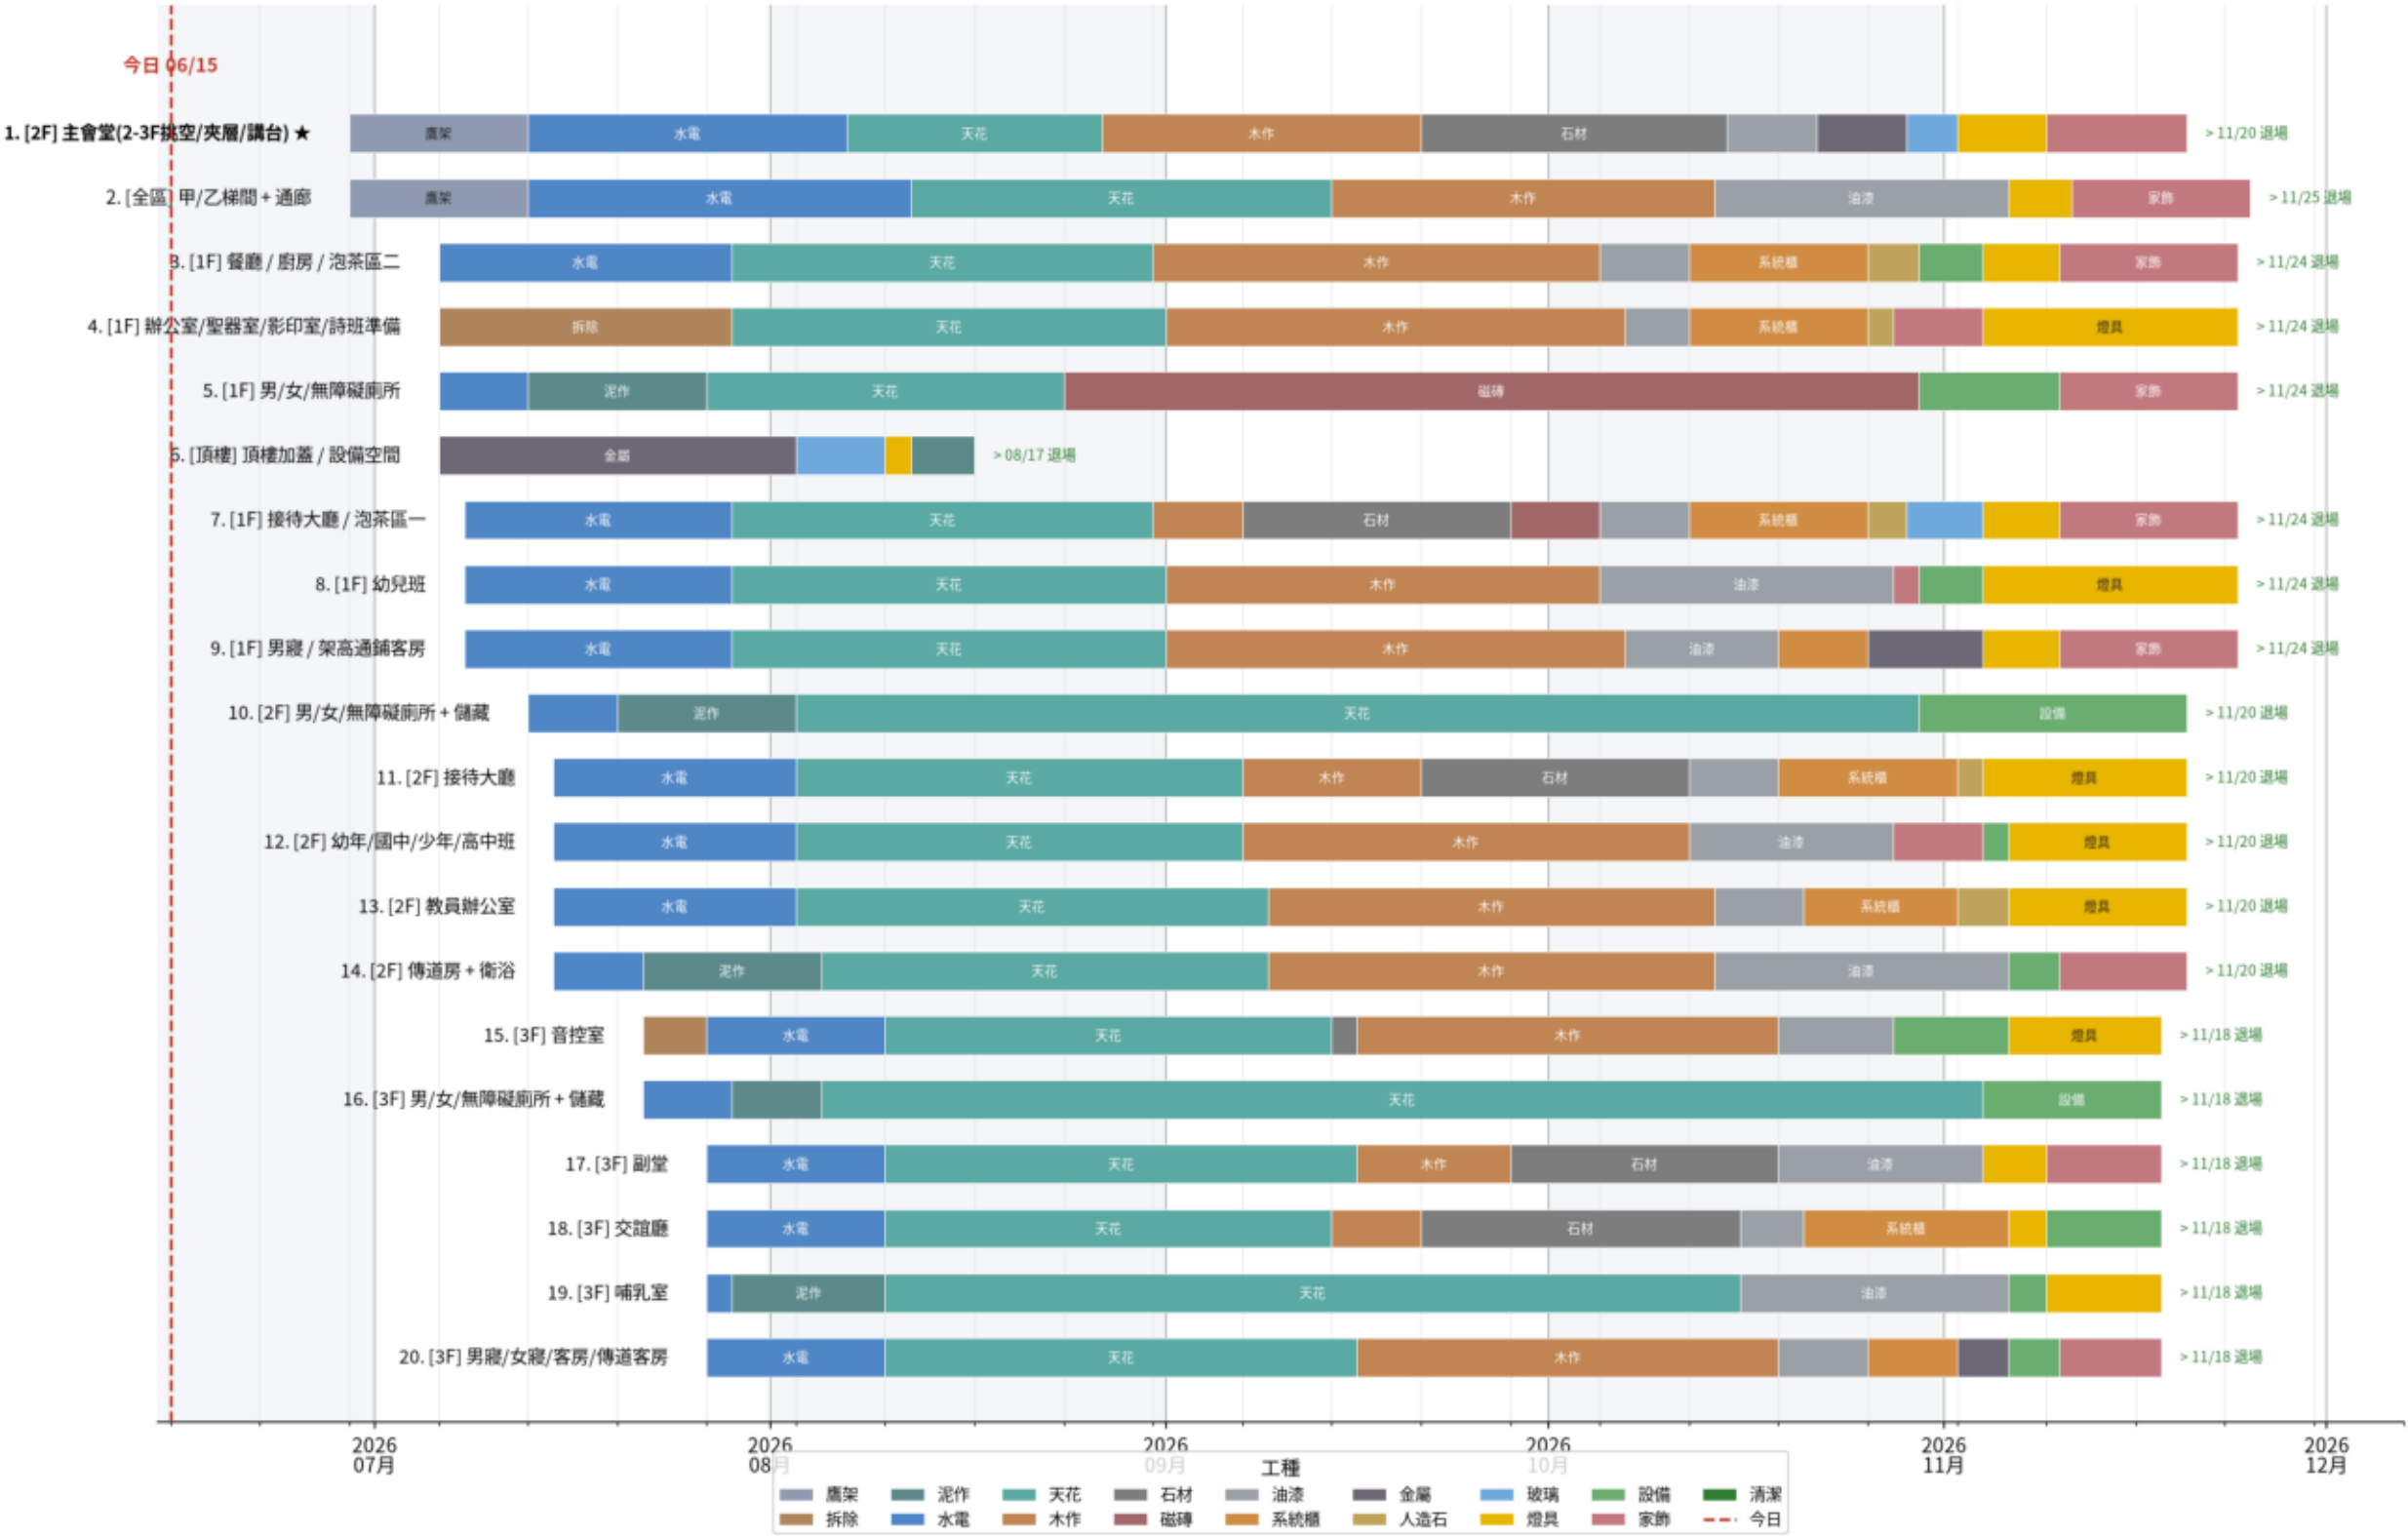

分區進場時程表（供現場照表調度）

順位	樓層	區域	類型	進場	天花	木作	石材	油漆	櫃體/床	退場	週
1	2F	主會堂(2-3F挑空/夾層/講台) ★	T2	06/29	08/07	08/27	09/21	10/15	10/22	11/20	21
2	全區	甲/乙梯間 + 通廊	T10	06/29	08/12	09/14		10/14		11/25	21
3	1F	餐廳 / 廚房 / 泡茶區二	T7	07/06	07/29	08/31		10/05	10/12	11/24	20
4	1F	辦公室/聖器室/影印室/詩班準備	T6	07/06	07/29	09/01		10/07	10/12	11/24	20
5	1F	男/女/無障礙廁所	T1	07/06	07/27		08/24			11/24	20
6	頂樓	頂樓加蓋 / 設備空間	T9	07/06					07/06	08/17	6
7	1F	接待大廳 / 泡茶區一	T3	07/08	07/29	08/31	09/07	10/05	10/12	11/24	20
8	1F	幼兒班	T5	07/08	07/29	09/01		10/05		11/24	20
9	1F	男寢 / 架高通鋪客房	T4	07/08	07/29	09/01		10/07	10/19	11/24	20
10	2F	男/女/無障礙廁所 + 儲藏	T1	07/13	08/03					11/20	19
11	2F	接待大廳	T3	07/15	08/03	09/07	09/21	10/12	10/19	11/20	18
12	2F	幼年/國中/少年/高中班	T5	07/15	08/03	09/07		10/12		11/20	18
13	2F	教員辦公室	T6	07/15	08/03	09/09		10/14	10/21	11/20	18
14	2F	傳道房 + 衛浴	T6/T1	07/15	08/05	09/09		10/14		11/20	18
15	3F	音控室	T8	07/22	08/10	09/16	09/14	10/19		11/18	17
16	3F	男/女/無障礙廁所 + 儲藏	T1	07/22	08/05					11/18	17
17	3F	副堂	T2	07/27	08/10	09/16	09/28	10/19		11/18	16
18	3F	交誼廳	T3	07/27	08/10	09/14	09/21	10/16	10/21	11/18	16
19	3F	哺乳室	T1/T5	07/27	08/10			10/16		11/18	16
20	3F	男寢/女寢/客房/傳道客房	T4	07/27	08/10	09/16		10/19	10/26	11/18	16

工程安排建議（一）

最該優先處理的 5 件事

1. 先封口「合約未含 4 工項」：泥作防水(尚未評估)、地坪、空調、油漆 — 皆在關鍵路徑/隱蔽界面，開工前務必界定範圍、廠商、費用。
2. 長交期項目立刻發包：石材、系統櫃(56被褥櫃+床組)、廠製門、頂樓鋼構、設備；偏遠工地運輸提前 4~8 週。
3. 以 2F 主會堂為核心：鷹架(6.8M)+80坪天花+花崗岩壁/地/講台+木作反射板疊在同一空間，集中資源、嚴控工序交接。
4. 鷹架一次到位：高處工項(天花、上部石材、油漆、燈具)排同一鷹架週期，避免重複搭拆。
5. 天花封板前完成消防/空調整合：不可逆隱蔽工程，錯過要拆天花重做。

合約未含 / 待評估工項（風險第一）

泥作/防水(尚未評估)：石材/磁磚/地坪都要等它；濕區須試水。排在拆除後、天花前。

地坪(未含)：影響石材踢腳收頭與櫃體立面高程；確認施作者、材質與完成面標高。

空調(未含)：室內外機/管線多在天花內，務必封板前定位點位。

油漆(未含)：介於木作之後、燈具/細清之前，漏排會卡住收尾，須排入時程。

待確認/取消：電視、投影機、洗衣機、淋浴門、二三樓玻璃門(不符法規暫取消)、防火門待評估 — 彙整清單逐項以追加減結案。

工程安排建議（二）

施工順序（單一空間）

保護/鷹架→拆除→泥作打底/防水→水電配管→輕鋼架天花骨架→(消防/空調整合)→封板→木作底→石材/磁磚→木作面/油漆→系統櫃→人造石/玻璃→燈具/設備→窗簾/家飾→清潔→驗收

分樓層流水

濕程/水電/天花：由下而上 1F→2F→3F；完成面收尾(油漆後)：由上而下 3F→1F 退場保護下層。各工班用 3 週前置看板滾動排程。

主會堂(關鍵空間)

鷹架搭設後先完成高處(天花/上部石材/燈具預留)再拆；講台為石材+木作+金屬三方交界，先做 1:1 放樣與大樣會審(B01系列)。

品質 / 安全 / 管控

每週工地會議＋月進度查核對照甘特圖；請款綁里程碑(開工/天花/石材/櫃體/交屋)。

高架作業(主會堂6.8M、頂樓吊裝、梯間防墜網)落實安全；教會若需部分使用採分區圍封。

頂樓鋼構為室外作業，雨季預留緩衝；偏遠運輸預留彈性；成品保護至細清前不拆。

工期優化

頂樓鋼構(室外)與室內泥作/水電平行省3~4週；可分區提前點交(如先交1F或2F主會堂)；注意社區壓縮工時之誤工加成(2.5~4%/0.5hr)。
